

智售助手项目周报0510

智售助手项目周报

项目负责人：陈育彬

填报周期：5月6日 - 5月9日

一、项目状态

关注

二、上周计划执行情况

请围绕上周计划逐项填写，作为项目上周实际进展的统一说明，不再单独重复填写“本周核心进展”。

上周计划事项	原计划完成时间	实际结果	是否完成	未完成原因及后续处理
事项1、重点品牌沟通 舜华鸭业、天创	5月9日	部分完成	是	舜华鸭业-零食品类技能待开发，延期上线
事项2、单品牌-周数据输出	5月9日	已完成	是	
事项3、兰卓丽推荐商品关键词优化	5月9日	未完成	否	

当前使用品牌情况跟进表：[📄 销售线索白测品牌跟进](#)

当前使用品牌周数据跟进表：[📄 品牌试点数据周复盘](#)


三、下周重点计划

- 计划1、兰卓丽关键词、推荐商品权重优化--预计周三；
- 计划2、固执针对生日、优惠券话术优化方案--预计周二前
- 计划3、天创试点门店确认及培训；固执线下门店培训；
- 计划4、单品牌-周数据输出

四、异常情况及需协调支持

- 异常/问题1：兰卓丽-试点导购对商品推荐中的钢圈&无钢圈、高腰&低腰、丰满&小杯、新款&旧款预下架等要求较高，目前依然反馈推荐精准性问题；
 - 影响：导购反馈准确性，但总部一定程度接受
 - 需要支持：技术侧沟通优化可能性
 - 是否需老板介入：否
-
- 异常/问题2：固执-试点导购对AI推荐的话术和商品反馈了优化问题。
 - ①会员购买历史中都是上下装的搭配，从未购买过连衣裙，旗袍等，系统推荐的都是裙子和旗袍。（定位原因：会员浏览过连衣裙）
 - ②会员是生日会员，未推荐生日话术，只有简单天气关怀；希望有生日情感链接、券相关的话术；
 - ③会员身上有券，浏览了商品，但推荐话术只有简单天气关怀，没有利益点说明；



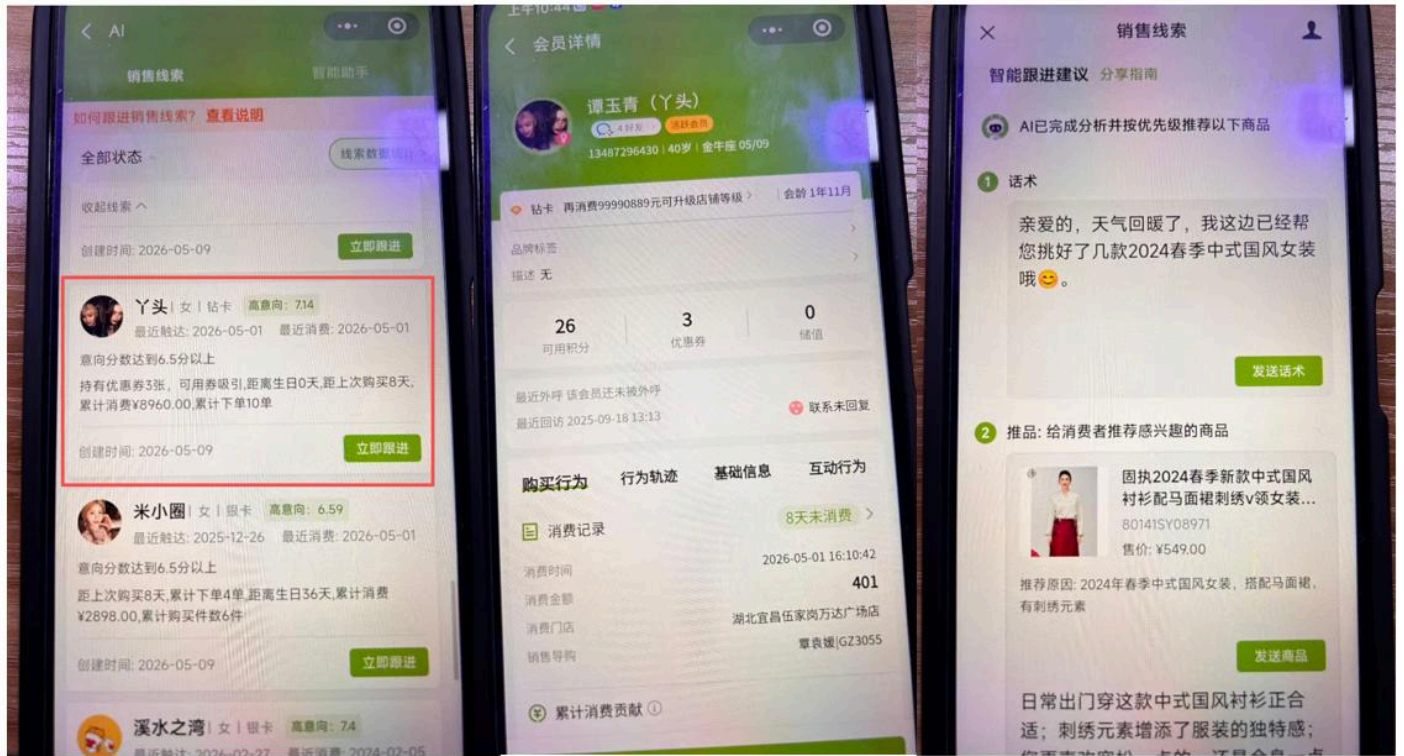

- 影响：总部人员对AI话术体验，会影响更进一步的使用
- 需要支持：技术侧正在优化
- 是否需老板介入：否
- 异常/问题3：舜华鸭业原计划节后刷数据完成，但目前需要调试适配零食行业的提示词，技术优化配置中，未明确时间
- 影响：延后舜华鸭业的白测时间
- 需要支持：技术侧沟通测试方法
- 是否需老板介入：否
- 异常/问题4：奥康和卓诗尼都已经刷数据，智能体平台测试，在品类和性别上不准确。需协调出一套方法，如何判断商品推荐初步准确的问题。（当前反馈：内部平台不代表客户实际的使用效果）
- 影响：影响客户体验
- 需要支持：技术侧沟通测试方法
- 是否需老板介入：否

五、关键里程碑

里程碑	计划时间	实际/预计时间	状态
里程碑1、确认重点推进品牌	4月底	4月22日	进行中
里程碑2、完成重点品牌首批门店试点上线	5月上旬	X月X日	待开始
里程碑3、扩大试点范围并形成标杆案例	X月X日	X月X日	待开始

填报说明

- 周报请于**每周日**前提交。
- 周报主要用于说明以下内容：
 - 上周计划执行情况
 - 下周重点计划
 - 异常情况及需协调支持事项
 - 关键里程碑变化情况
- 请尽量简洁填写，避免重复描述，非必要信息不展开。
- 其他非常规事项，统一纳入“异常情况及需协调支持”。
- 周报重点是便于快速判断：
 - 上周承诺事项是否按计划完成
 - 当前项目推进是否正常
 - 下周重点安排是什么
 - 是否存在需要协调或升级处理的问题
